



Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld





Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld

Van: 9
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 15:47
Aan: 9
CC: 9
Onderwerp: Onderwerpen portefeuilleteam intelligence woensdag 24 april
Bijlagen: Hoofdpuntenrapport Portefeuille Intelligence 2019 Q1 concept.pdf; ; Niet onder reikwijdte .pptx; Niet onder reikwijdte

Beste 9,

Volgende week woensdag is er portefeuilleteamoverleg. 9 kan daar niet bij zijn. Ik ben er in plaats van hem.

Graag willen we voor het overleg agenderen:

- HPR 2019Q1 (bijlage) en de volgende onderwerpen daaruit
  - Niet onder reikwijdte
  -
  -
  -
- Niet onder reikwijdte
- Samenstellen viermaandsrapportage

Groet,

9
9
Politie | Portefeuille intelligence

06 9
Bezoek: Kwekerijweg 6 | Zeist
Post: Postbus 238 | 3970 AE | Driebergen


Hoofdpuntenrapport Portefeuille Intelligence


Januari
Februari
Maart
2019


Voor het portefeuillehouderoverleg 12 april 2019
Concept
11 april 2019

Inhoud


Inleiding....3
Indicatie van voortgang....3
Belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering....3
Vragen - Portefeuilleteam....3
Beslissen - Platform Informatieorganisatie....5
Realiseren - Implementeren IGP-werkwijze en –instrumenten....6
Realiseren - BI strategie....8
Realiseren - Vakmanschap, kennis en innovatie....10



12-14



12-14



12-14

12-14






12-14



12-14



12-14


12-14






12-14


Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte

Niet onder reikwijdte



Niet onder reikwijdte



Niet onder reikwijdte




Niet onder reikwijdte

Niet onder reikwijdte




Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte

Niet onder reikwijdte



Van: 9
Aan: 9
Cc: 9 9
Onderwerp: Financiering Raffinaderij
Datum: woensdag 17 april 2019 13:51:07
Bijlagen: 20190411_Agendapunt_1a_Raffinaderij - Vernieuwd programmaplan_1.1 .pdf

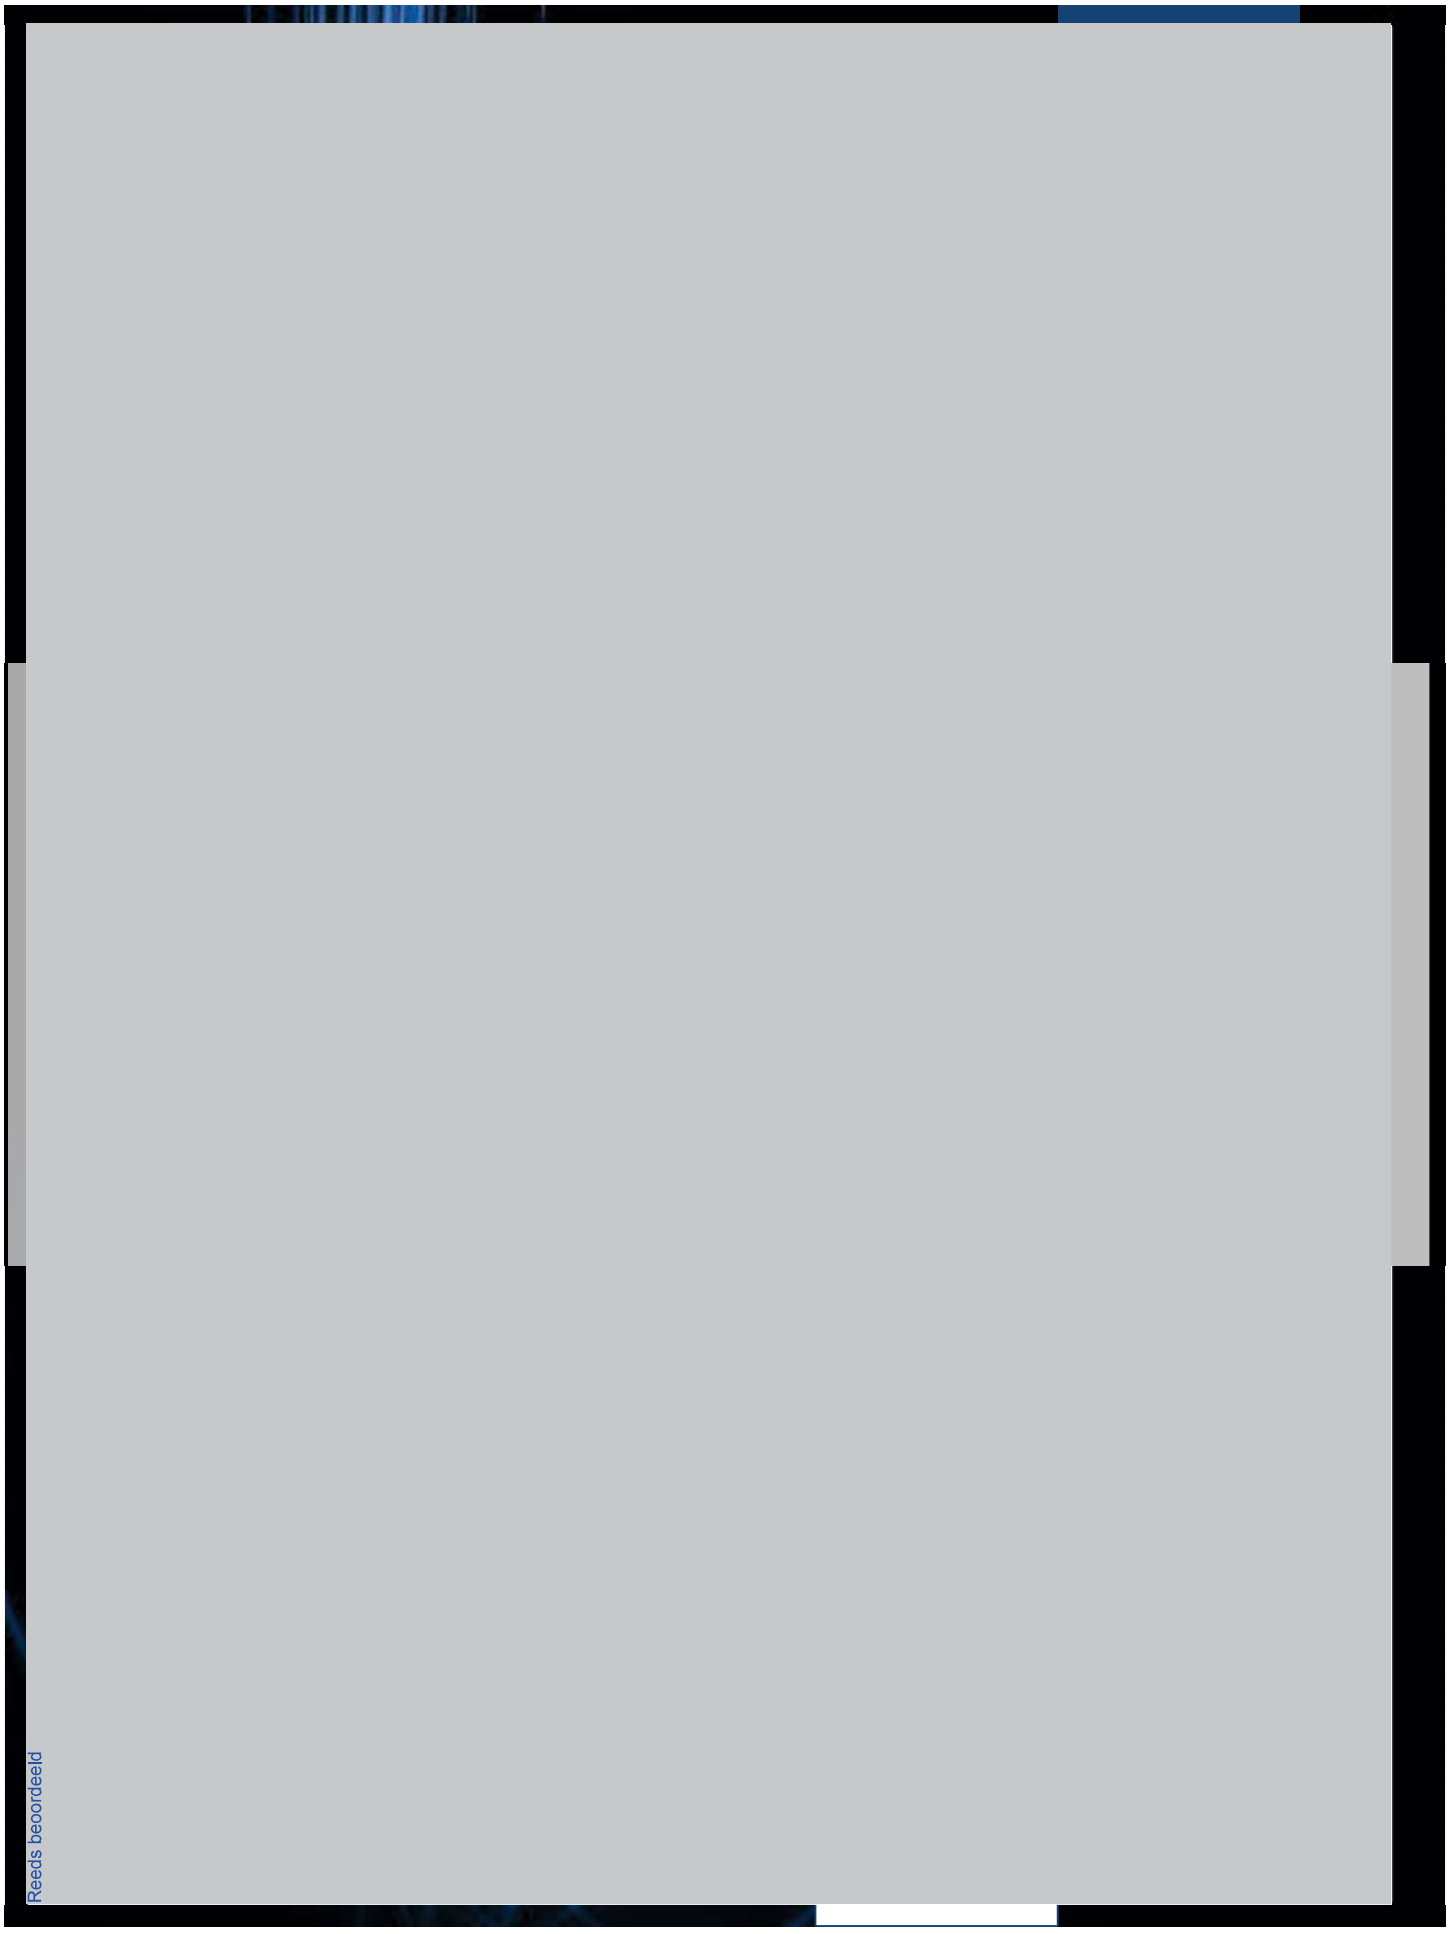
Hoi 9

Niet onder reikwijdte

Met vriendelijke groet,

9
9

Politie | PDC | Dienst ICT
Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 06 9


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld

*7-11-12

Reeds beoordeeld




Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld





Reeds beoordeeld

Onderstaande financiële middelen zijn nodig voor het waarmaken van de ambitie

		2019 (incl. BTW, x1000)	2020 (indicatief)	2021 (indicatief)
1	Inhuur deelprojectleiders	400	400	400
2	Inhuur veranderkundig advies	60	60	60
3	Communicatiemiddelen	50	50	50
4	Projectmiddelen (incl. effectmeting, opleidingskosten en reiskosten)	190	150	150
5	Competentieontwikkeling voor het team (o.a. studiereis)	40	40	40
6	6-12			
7				
8				
9				
10				
	Totaal	6-12		


Ad 1 Uitgangspunt is dat (deel)projectleiders interne medewerkers zijn. Voorziening opgenomen voor inhuur van 2 fte indien intern kwalitatief of kwantitatief onvoldoende beschikbaarheid.
Ad 2 Veranderkundige ondersteuning op programma wordt ingehuurd. Indien levering door PDC kunnen deze kosten van de begroting.
Ad 4 Raffinaderij vergt veel randvoorwaardelijke aanpassingen bij PDC, Staf en PA. Aangezien de afdelingen nog niet bewust zijn van de vereisten en deze dus ook nog niet op de eigen begroting hebben opgevoerd, is een voorziening in deze begroting opgenomen. Reiskosten oa. voor internationale afstemming.
Ad 5-8 Middelen voor IV ontwikkeling, beheer en support worden onderbouwd in separaat PID Raffinaderij. In het PID worden eveneens de benodigde IV/IM uren opgenomen.
Ad 6-7 Het contract met Palantir betekent dat er reeds verplichtingen zijn aangegaan voor boven genoemde bedragen. Dit dient in de besluitvorming meegewogen te worden.


Reeds beoordeeld



Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld


Reeds beoordeeld

Van: 9
Aan: 9
Cc: 9 9 9 9 9 9
Onderwerp: Re: assumptions
Datum: donderdag 19 april 2018 09:28:09

Hi all,
Just updating – I should have the price list to you in next day. The workshops for Tuesday in the Refinery took my focus (for very good outcomes on project level), so catching up now on contract steps.

Hope all are well and enjoying the Spring weather in Amsterdam.

Warm regards,
9

_____
9 @palantir.com
USA +1-9
_____

Van: 9
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 17:51
Aan: 9 <9 politie.nl>
Onderwerp: Contract Palentir

Hoi 9

Er staat me bij dat ik het contract met Palentir een keer heb gelezen, maar ik kan het in mijn mails niet meer terugvinden. Had ik dit van jou gekregen?

Groet, 9

Van: 9
Aan: 9
Onderwerp: RE: Contract Palentir
Datum: dinsdag 7 mei 2019 17:49:19
Bijlagen: SOW #1 NLPD Palantir DEFINITIVE CONCEPT v3.0 (Police Requested Edits).pdf
Raffinaderij heimelijke verwerving.msg

9

Hierbij het Statement of Work (SOW), op dit moment het meest relevant.
Als je de overige documenten (master licence agreement en palantir support services) ook wilt, laat maar even weten.
Ik kijk daar zelf nooit in.

Het betreft een contract verkregen op basis van heimelijke verwerving en informatie wordt op need-to-know basis gedeeld, dus verzoek om hier rekening mee te houden (zie ook 2e bijlage).

Groet,

9

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Van: 9
Aan: 9
Onderwerp: RE: Contract Palentir
Datum: dinsdag 7 mei 2019 19:36:09

Hoi 9

Bedankt. Ik heb een citaat uit de SOW gehaald over opleidingen en met 9 gedeeld. Is voor nu voldoende.

Groet, 9

Van: 9
Aan: 9 9
Onderwerp: FW: SOW Raffinaderij
Datum: donderdag 9 mei 2019 09:59:32
Bijlagen: SOW #1 NLPD Palantir DEFINITIVE CONCEPT v3.0 (Police Requested Edits).pdf
Raffinaderij heimelijke verwerving.msg

---

9 en 9

Hierbij het Statement of Work (SOW), waarin gerefereerd wordt naar het security model NLPD.

Het SOW is onderdeel van een contract verkregen op basis van heimelijke verwerving en informatie wordt op need-to-know basis gedeeld, dus verzoek om hier rekening mee te houden (zie ook 2e bijlage).

Groet,

9

9
9

Politie | Politiedienstencentrum | | 9

Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 06 9

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld


Van: 9
Aan: 9 9 9
Onderwerp: Businesscase 7-11-12 v0.5
Datum: maandag 13 mei 2019 13:31:11
Bijlagen: Businesscase 7-11-12 v0.5.xlsm

Projectkosten aangepast.

12-14




12-14


12-14

12-14

12-14

12-14


Niet onder reikwijdte


Niet onder reikwijdte

Van: 9 @politie.nl>
Verzonden op: woensdag 22 mei 2019 16:09
Aan: "9 <9 politie.nl>
Onderwerp: RE: bedrag contract Niet onder reikwijdte

Hoi 9

Dank je.

Niet onder reikwijdte

Zie onder (voorlopige tussenstand):

Palantir Contract (3,5 jaar)	€	6-10-12
Palantir Implementatiekosten fase 1	€	

Niet onder reikwijdte

Met vriendelijke groet,

9
9

Politie | Politiedienstencentrum | 9

Europalaan 93, 3526 KP Utrecht
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 06 9

Aanwezig ma t/m do

Van: 9
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 16:56
Aan: 9
Onderwerp: RE: bedrag contract Niet onder reikwijdte

Niet onder reikwijdte

Verzonden met Samsung, groet 9 programmamanager Raffinaderij

Van: 9
Verzonden: dinsdag 4 juni 2019 15:00
Aan: 9 <9 politie.nl>
Onderwerp: Input afstemming 9 en 9

Hi 9

Bijgevoegd de twee slide's (inclusief bronbestand gebruikte tabellen) ter ondersteuning bij het gesprek met 9 en 9 voor morgen ochtend.

Met vriendelijke groet,

9
9
Politie Diensten Centrum | Dienst ICT | 9
Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 06 9
e-mail: 9 politie.nl
Aanwezig ma t/m do

Voortgangsrapportage Q2 2019
(status 29 mei 2019)

Programma
Raffinaderij

1450

leeswijzer

Dit is de tweede voortgangsrapportage Raffinaderij van 2019. In de stuurgroep van mei 2019 wordt gerapporteerd over de periode april / mei 2019. Om agendatechnische redenen kon de stuurgroep niet in juli gepland worden. Daarom zal begin juli de rapportage over geheel Q2 2019 per mail aangeboden worden aan de stuurgroep, tenzij er aanleiding is om een extra stuurgroep bijeen te roepen.

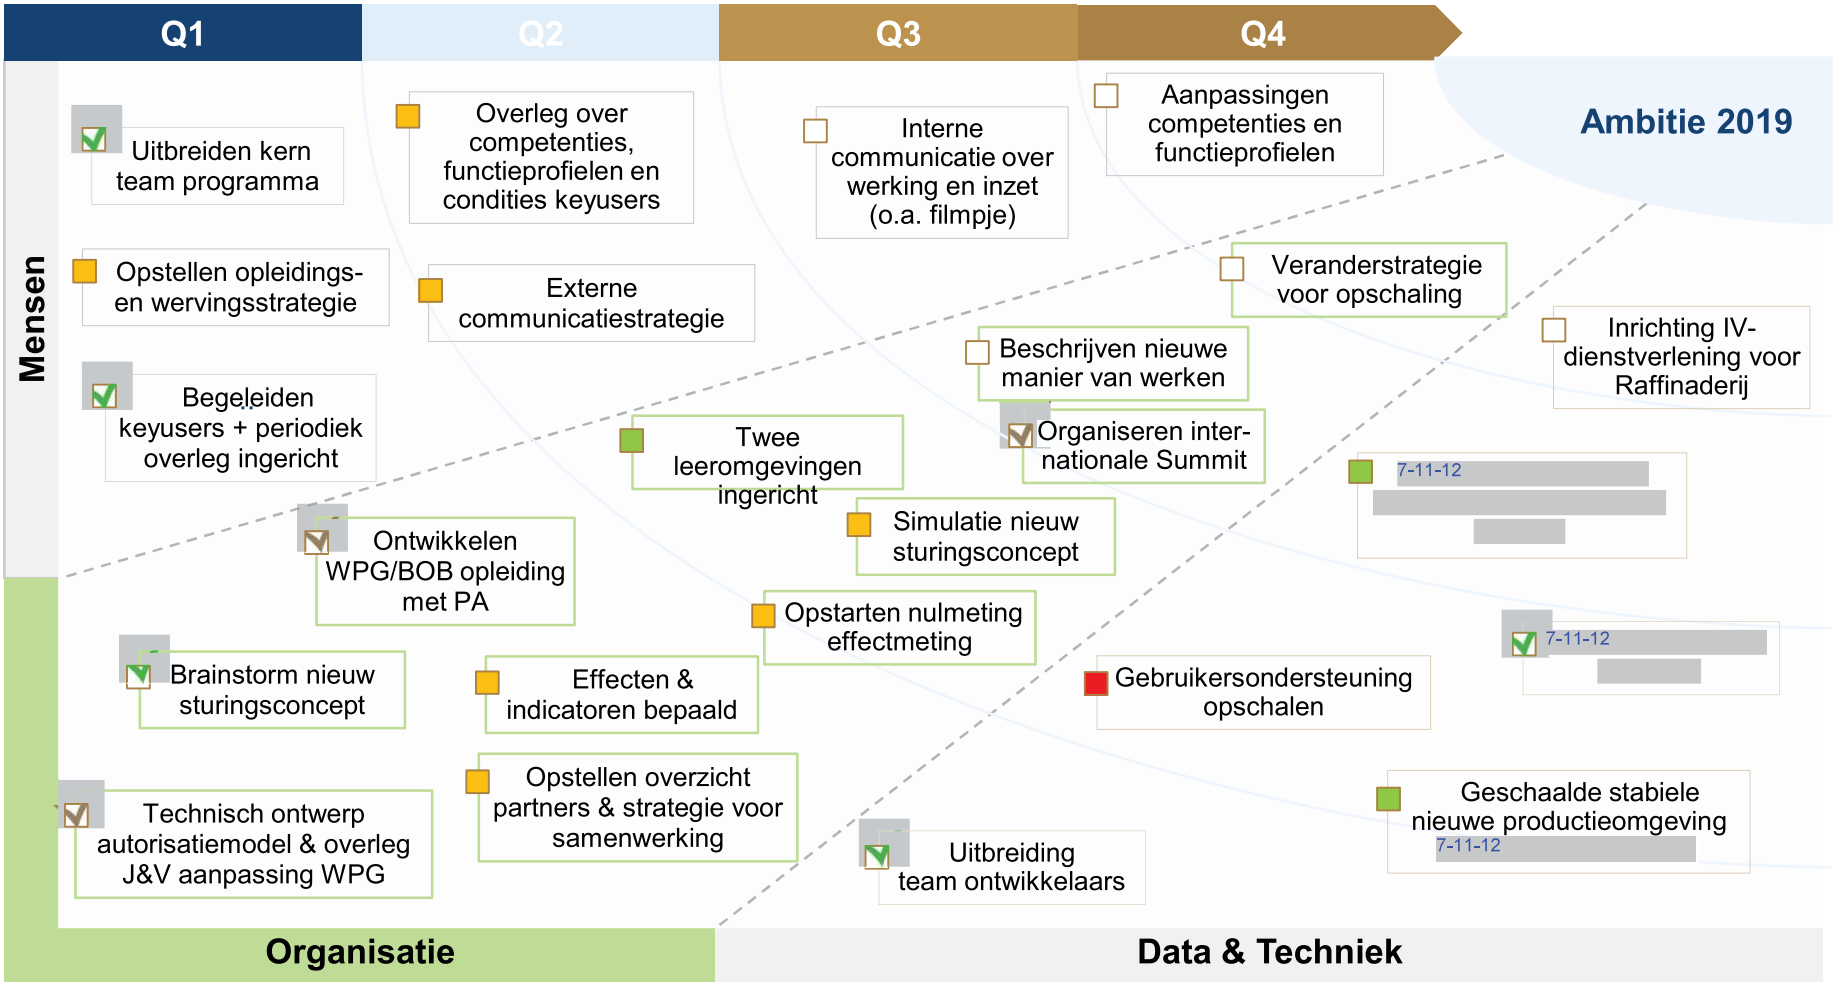
Het doel van deze rapportage is inzicht bieden in de voortgang van de uitvoering van het programmaplan en eventuele issues die spelen. Hierdoor kan de stuurgroep waar nodig direct bijsturen. De vorm van rapporteren is in lijn met het opgestelde programmaplan. De roadmap vormt de basis, vervolgens wordt per stroom een kort overzicht gegeven van voortgang, successen, aandachtspunten en benodigde acties.

Deze rapportage wordt aan het einde van elk kwartaal opgeleverd. Elk half jaar evalueren we de voortgang en koers en stellen we deze waar nodig bij.

Veel leesplezier.

programmamanager Raffinaderij

Roadmap 2019 – Raffinaderij



Algemene voortgang Programma Raffinaderij 1/2

Langzaam maar zeker begint het programma Raffinaderij zichtbaar vorm te krijgen. Er zijn inmiddels een aantal key-user bijeenkomsten geweest, de (nieuwe) projectleiders zijn voortvarend gestart en het landelijk programmateam is bijna op sterkte. 7-11-12 Tweemaal per week vinden er gebruikerssessies plaats waarin de gewenste functionaliteit die 7-11-12 beschikbaar moet komen wordt besproken.

7-11-12

Algemene voortgang Programma Raffinaderij 2/2

Ieder half jaar wordt de voortgang van het programmaplan geëvalueerd en wordt bepaald of het programmaplan aangepast moet worden.

Het programmateam is tot de conclusie gekomen dat er een (beperkte) bijstelling op het programmaplan nodig is. Dit komt enerzijds doordat het programmateam later dan gewenst op sterkte is gekomen en hierdoor de verschillende stromen binnen het programma niet volledig op elkaar afgestemd waren. Anderzijds [redacted]

Als gevolg van bovenstaande punten komen bepaalde acties, die in de 1e helft van 2019 waren voorzien, pas later op gang, waardoor een bijstelling van het programmaplan noodzakelijk is. Het bijgestelde programmaplan zal in juli 2019 aan de leden van de stuurgroep worden aangeboden.

Hierna volgt per stroom uit het programmaplan een stand van zaken.

Stroom 1 – Mensen

Loopt goed
Verdient aandacht
Direct actie gewenst

Status Stroom 1: Mensen		

Gedaan afgelopen periode

- Eerste oriënterende gesprekken met HRM gevoerd (intel & opsporing)
- Outline 7-11-12 opgesteld. Wordt in juni besproken met key-users.

Successen

- 6-wekelijks overleg key-users ingeregeld
- Samen met de key-users worden handleidingen/helpers ontwikkeld.
- Externe communicatieadviseur gestart.

Aandachtspunten

- 12-14

Te doen aankomende periode

- In juni bijeenkomst met HRO, HRM en PA-vertegenwoordiging over toekomstvisie opleidingen.
- Overleg met HRO intensiveren rondom competenties, functieprofielen en condities key-users.
- Versterken aansluiting HRM-ondersteuning.
- Interne en externe communicatiestrategie opstellen.
- Updaten en stroomlijnen Agora-pagina voor key-users en gebruikers.
- Ontwikkelen woordvoeringslijn t.b.v. externe communicatie.

Loopt goed
Verdient aandacht
Direct actie gewenst

Stroom 2 – Organisatie

Status Stroom 2: Organisatie	

Gedaan afgelopen periode

- Overzicht gemaakt van activiteiten benodigd rondom rondom privacy & autorisaties.
- Eerste bijeenkomst functionele scope gehad met als doel technisch ontwerp 3.19 (workflows) aan te laten sluiten op werkprocessen en behoefte business.
- Brainstorm met [9] gehad rondom sturingsconcept en twee leeromgevingen.

Successen

- Workshop gepland in ZWB (13 juni) als eerste van een reeks (aanbod aan alle eenheden). Doel is zicht krijgen op ambitie & gewenst effect, veranderuitdaging per eenheid en te regelen randvoorwaarden. Ook: verwachtingen managen.
- [9] heeft helderheid over welke acties moeten gebeuren om bij de eenmeting van de gegevensautoriteit te voldoen aan wetgeving.

Aandachtspunten

- [12-14]

Te doen aankomende periode

- Kaders privacy & autorisaties communiceerbaar maken, inzetten op bewustwording & werking in de praktijk
- Acties privacy & security overzichtelijk in beeld brengen
- Twee leeromgevingen verder vormgeven in [7-11-12] Sturingsconcept meenemen in beiden.
- Effecten bepalen als onderdeel van lokale plannen van aanpak – te beginnen met Zeeland West Brabant en vervolgens ook in andere eenheden. Is afhankelijkheid om te kunnen starten met nulmeting.
- Functionele scope vertalen naar workflows en laten vaststellen in steering committee Palantir.

Loopt goed
Verdient aandacht
Direct actie gewenst

Stroom 3 – Data & Techniek

Status
Stroom 3: Data & Techniek

Gedaan afgelopen periode

- 7-11-12 geïnstalleerd en geconfigureerd op nieuwe omgeving.
- 7-11-12
- 7-11-12
- 7-11-12

Successen

- PID 2 11 7 11 (Data & Techniek deel) goedgekeurd door PAB onder voorwaarden van financiën
- Eerste key users hebben toegang tot de nieuwe omgeving met 7-11-12
- 7-11-12
- Eerste set van workflows werkend op 7-11-12
- 7-11-12

Aandachtspunten

12-14

Te doen aankomende periode

7-11-12

Stroom 4 – Financiering Programma Raffinaderij

Aangegane verplichtingen	Bedrag
Palantir Contract (3,5 jaar)	
Palantir Implementatiekosten fase 1	

6-10-12

Niet onder reikwijdte

- Stand van zaken financiële dekking Programma Raffinaderij (Willem)

Gevraagd besluit

Stuurgroep Raffinaderij wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Q2 2019.
- Akkoord te geven om het programmaplan Raffinaderij in lijn te brengen met de huidige inzichten.

Het bijgestelde programmaplan Raffinaderij zal in juli 2019 per mail ter goedkeuring aangeboden worden aan de stuurgroep Raffinaderij.



« waakzaam en dienstbaar »

Van: 9
Aan: 9
Onderwerp: RE: Input afstemming 9 en 9
Datum: dinsdag 4 juni 2019 16:55:27
Bijlagen: image001.png
20190606_Agendapunt 3a_Raffinaderij - voortgangsrapportage Q2 2019.pdf

---

9

Over de slide met kosten nog een aantal opmerkingen:

12-14

Checkvraag

- 12-14

Groet,

9

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Reeds beoordeeld

Van: 9
Aan: 9
Onderwerp: RE: Input afstemming 9 en 9
Datum: dinsdag 4 juni 2019 17:06:12
Bijlagen: image001.png

---

9 ,

Nog een punt (na enige mijmering)
12-14

9

Van: 9
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 16:24
Aan: 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 politie.nl>; 9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 @politie.nl>; 9 9 politie.nl>; 9 politie.nl>
Onderwerp: 7-11-12 Faseplan Vernieuwen en Borgen 010.docx

Beste 9 ,

Jullie zijn natuurlijk de eersten die ik ga verblijden met het nieuwe faseplan.
Bijgaand versie 0.10, met verzoek aan 9 , 9 en 9 om detail informatie aan te leveren op hun expertise gebieden (zie in document).
9 is gestart met de administratie te doorgronden, dus bij een volgende versie zullen we de eerste resultaten van zijn werk zien.
Jullie op- of aanmerkingen zijn zoals altijd van harte welkom.

Groeten,
9

9
Programmamanager
Politie | Politiedienstencentrum | | 9
Zeisterweg 1, 3984 NH Odijk
Postbus 238, 3970 AE Driebergen
M 06 9

Faseplan Vernieuwen en Borgen

Project

7-11-12

9

Concept

Versie 0.10

Versie datum 5 juni 2019

Rubricering Politie Intern

« waakzaam en dienstbaar »

Documentinformatie

Context
Het project 7-11-12 omvat het data & techniek gedeelte van 7-11-12]. Het overal projectplan en uitwerking van de eerste uitvoeringsfase, Stabiliseren, is vastgelegd in het Project Initiatie Document [2]. Dit is faseplan is een verdere uitwerking van de afspraken tussen opdrachtgever en projectmanager voor de tweede uitvoeringsfase, Vernieuwen en Borgen.

Het uitgangspunt is om een beknopt en leesbaar document op te leveren. Indien er behoefte is aan meer achtergrond, wordt geadviseerd het PID en/of Programmaplan te raadplegen.

Locatie
Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het project 7-11-12

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing
0.10	05-06-2019	Initiële versie

Distributie

Versie	Naam

Review commentaar

Versie	Wie

© Politie, all rights reserved.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

Documentinformatie 2

Inhoudsopgave 2

1. Fasebeschrijving 4
   1.1. Doelstellingen 4
   1.2. Faseresultaten 4
   1.3. Brondocumenten 5

2. Faseplan 6
   2.1. Uitgangspunten 6
   2.2. Randvoorwaarden / afhankelijkheden 6
   2.3. Aanpak 6
   2.4. Planning 7
   2.5. Uren en Kosten 8
   2.6. Afwijkingen t.o.v. (de businesscase uit) het PID 9
   2.7. Acceptatie en borging van productkwaliteit 9

3. Projectorganisatie 10
   3.1. Organogram ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
   3.2. Stuurgroep-samenstelling ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
   3.3. Stakeholders ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

Bijlage 1. Scope 14

Bijlage 2. Overzicht producten 15

Bijlage 3. Capaciteit en kosten totaal project 16

Bijlage 3: Businesscase 18

Bijlage 4. Risicomanagement 19

Bijlage 5. Leerpunten voorgaande fase 20

12-14

1.3. Brondocumenten

#	Document	Versie	Datum	PTB
1	Raffinaderij – vernieuwd programmaplan (powerpoint)	1.1	april 2019	
2	PID Project 7-11-12	0.95	16-05-2019	
3	Statement of Work #1 Definitive concept		2018	Nee (*)

(*) vanwege het confidentiële karakter van de inhoud worden deze documenten niet in 7-11-12 opgeslagen.

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14


12-14

12-14

12-14


12-14


12-14


12-14

12-14



12-14

Van: 9
Aan: 9
Onderwerp: FW: Raffinaderij: heimelijke verwerving
Datum: dinsdag 11 juni 2019 11:32:46

Ter info, 9 is de[9] voor Palantir: +31 6 9

Van: 9
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 15:31
Aan: 9 @politie.nl>
Onderwerp: Niet onder reikwijdte

Hoi 9

Niet onder reikwijdte

Groeten, 9

Van: 9
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 17:40
Aan: 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>
Onderwerp: 7-11-12 Faseplan Vernieuwen en Borgen 020.docx

Hoi allemaal,

Bijgaand versie 0.20 met updates.
Nog niet alles is ingevuld, maar het plan begint al wel aardig vorm te krijgen.

Graag jullie op- of aanmerkingen.

Alvast bedankt hiervoor,

9

Faseplan Vernieuwen en Borgen

Project

7-11-12

9

Concept

Versie 0.20

Versie datum 13 juni 2019

Rubricering Politie Intern

« waakzaam en dienstbaar »

Documentinformatie

Context
Het project 7-11-12 omvat het data & techniek gedeelte van 7-11-12 . Het overal projectplan en uitwerking van de eerste uitvoeringsfase, Stabiliseren, is vastgelegd in het Project Initiatie Document [2]. Dit is faseplan is een verdere uitwerking van de afspraken tussen opdrachtgever en projectmanager voor de tweede uitvoeringsfase, Vernieuwen en Borgen.

Het uitgangspunt is om een beknopt en leesbaar document op te leveren. Indien er behoefte is aan meer achtergrond, wordt geadviseerd het PID en/of Programmaplan te raadplegen.

Locatie
Dit document wordt bewaard in het projectdossier van 7-11-12

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing
0.10	05-06-2019	Initiële versie van faseplan, fasebeschrijving en projectorganisatie.
0.20	13-06-2019	Update van faseplan, fasebeschrijving en projectorganisatie. Product beschrijvingen toegevoegd

Distributie

Versie	Naam
0.10	PO Support team Raffinaderij
0.20	9 , 9 , 9 ,9

Review commentaar

Versie	Wie
0.10	9

© Politie, all rights reserved.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

Documentinformatie 2

Inhoudsopgave 2

1. Fasebeschrijving 4
   1.1. Doelstellingen 4
   1.2. Faseresultaten 4
   1.3. Brondocumenten 5

2. Faseplan 6
   2.1. Uitgangspunten 6
   2.2. Randvoorwaarden / afhankelijkheden 6
   2.3. Aanpak 7
   2.4. Planning 9
   2.5. Uren en Kosten 10
   2.6. Afwijkingen t.o.v. (de businesscase uit) het PID 10
   2.7. Acceptatie en borging van productkwaliteit 10
   2.8. Privacy en Security 11

3. Projectorganisatie 12
   3.1. Stuurgroep Raffinaderij 12
   3.3. Raffinaderij Programma 13
   3.4. Stakeholders 14

Bijlage 1. Scope 16

Bijlage 2. Overzicht producten 17

Bijlage 3. Capaciteit en kosten totaal project 23

Bijlage 4: Businesscase 25

Bijlage 5. Risicomanagement 26

12-14

1.3. Brondocumenten

#	Document	Versie	Datum	PTB
1	Raffinaderij – vernieuwd programmaplan (powerpoint)	1.1	april 2019	
2	PID Project 7-11-12	0.95	16-05-2019	
3	Statement of Work #1 Definitive concept		2018	Nee (*)

(*) vanwege het confidentiële karakter van de inhoud worden deze documenten niet in 7-11-12 opgeslagen.

12-14

12-14


12-14

12-14

12-14

12-14

12-14



12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14


12-14


12-14


12-14


12-14

Van: 9
Verzonden: vrijdag 21 juni 2019 17:02
Aan: 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 @politie.nl>; 9 9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>; 9 <9 politie.nl>
Onderwerp: 7-11-12 Faseplan Vernieuwen en Borgen 030.docx

Hoi,

Volgende stap 0.30.
Verdere detaillering van producten maakt planning scherper.
Eerste uren en kosten inschattingen toegevoegd.

Fijn weekend allemaal,

9

Faseplan Vernieuwen en Borgen

Project

7-11-12

9

Concept

Versie 0.30

Versie datum 21 juni 2019

Rubricering Politie Intern

Documentinformatie

Context
Het project 7-11-12 omvat het data & techniek gedeelte van 7-11-12 Het overal projectplan en uitwerking van de eerste uitvoeringsfase, Stabiliseren, is vastgelegd in het Project Initiatie Document [2]. Dit is faseplan is een verdere uitwerking van de afspraken tussen opdrachtgever en projectmanager voor de tweede uitvoeringsfase, Vernieuwen en Borgen.

Het uitgangspunt is om een beknopt en leesbaar document op te leveren. Indien er behoefte is aan meer achtergrond, wordt geadviseerd het PID en/of Programmaplan te raadplegen.

Locatie
Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het project 7-11-12

Met opmerkingen [A1]: 12-14

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing
0.10	05-06-2019	Initiële versie van faseplan, fasebeschrijving en projectorganisatie.
0.20	13-06-2019	Update van faseplan, fasebeschrijving en projectorganisatie. Product beschrijvingen toegevoegd
0.30	21-06-2019	Update van fasebeschrijving (aanpak, planning, kosten, uren) en product beschrijvingen

Distributie

Versie	Naam
0.10	9 team Raffinaderij
0.20 0.30	9 9 9 9

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

Review commentaar

Versie	Wie
0.10	9
0.20	9

© Politie, all rights reserved.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

Documentinformatie 2

Inhoudsopgave 2

1. Fasebeschrijving 4
   1.1. Doelstellingen 4
   1.2. Faseresultaten 4
   1.3. Brondocumenten 5

2. Faseplan 6
   2.1. Uitgangspunten 6
   2.2. Randvoorwaarden / afhankelijkheden 6
   2.3. Aanpak 7
   2.4. Planning 9
   2.5. Uren en Kosten 10
   2.6. Afwijkingen t.o.v. (de businesscase uit) het PID 11
   2.7. Acceptatie en borging van productkwaliteit 11
   2.8. Privacy en Security 11

3. Projectorganisatie 12
   3.1. Stuurgroep Raffinaderij 12
   3.3. Raffinaderij Programma 13
   3.4. Stakeholders 14

Bijlage 1. Scope 16

Bijlage 2. Overzicht producten 17

Bijlage 3. Capaciteit en kosten totaal project 24

Bijlage 4: Businesscase 26

Bijlage 5. Risicomanagement 27

12-14

1.3. Brondocumenten

#	Document	Versie	Datum	PTBFC
1	Raffinaderij – vernieuwd programmaplan (powerpoint)	1.1	april 2019	Ja
2	PID Project 7-11-12	0.95	16-05-2019	Ja
3	Statement of Work #1 Definitive concept		2018	Nee (*)

12-14

(*) vanwege het confidentiële karakter van de inhoud worden deze documenten niet in 7-11-1 -12 opgeslagen.

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

12-14

12-14

12-14

12-14

12-14

Met opmerkingen [A2]: 12-14

12-14

Met opmerkingen [A3]: 12-14

12-14

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

12-14

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

12-14

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

12-14

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)

Met opmaak: Frans (standaard)

12-14

Met opmaak: Engels (Verenigde Staten)
